# Aufgabe 8 – Firewall-Austausch

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

**Ausgangssituation:** Eine Firma tauscht ihre Hauptfirewall in einem Wartungsfenster aus. Vorher müssen Regelwerk, Beschaffung und Test parallel bearbeitet werden.

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
|---|---|---|---|
| 1 | Kick-off | 1 | – |
| 2 | Regelwerk dokumentieren | 3 | 1 |
| 3 | Firewall beschaffen | 7 | 1 |
| 4 | Regelwerk bereinigen | 2 | 2 |
| 5 | Lieferung prüfen | 1 | 3 |
| 6 | Firewall vorkonfigurieren | 4 | 4, 5 |
| 7 | Testumgebung aufbauen | 3 | 2 |
| 8 | Regeln im Testnetz prüfen | 3 | 6, 7 |
| 9 | Wartungsfenster abstimmen | 2 | 1 |
| 10 | Austausch und Funktionstest | 3 | 8, 9 |
| 11 | Abnahme und Dokumentation | 2 | 10 |

**Legende**




Hinweis: Es gibt genau einen kritischen Pfad. Notieren Sie sich bei jedem Vorgang, wie Sie FAZ/SEZ ermittelt haben (MAX vorwärts, MIN rückwärts).

# Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Netzplan

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

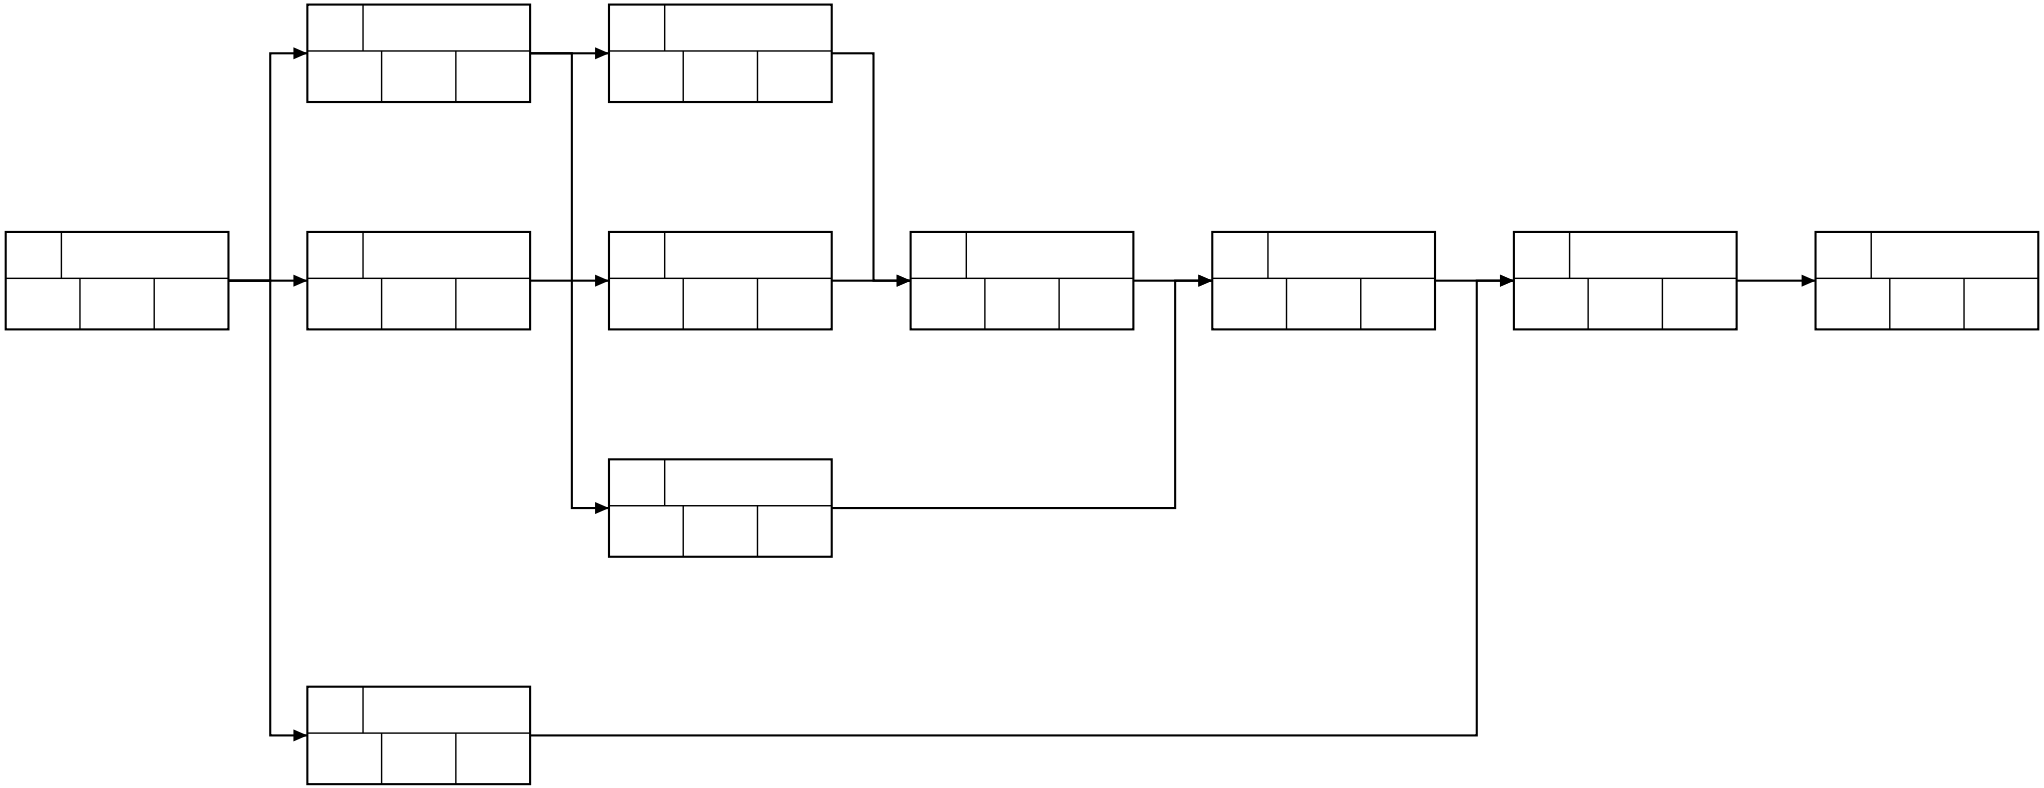

Projektdauer: _____ Tage

Kritische(r) Pfad(e): _____

# Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Fragen

Begründen Sie jede Antwort mit den Zeitwerten aus Ihrem Netzplan.

**b)** Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

**c)** Das Regelwerk lässt sich nicht an einem Tag, sondern erst nach 3 zusätzlichen Tagen bereinigen (Vorgang 4 dauert 3 Tage länger). Wie wirkt sich das aus?

**d)** Die Lieferung der Firewall (3) verzögert sich um 2 Tage. Berechnen Sie die neue Projektdauer.

**e)** Geben Sie für das Wartungsfenster (Vorgang 9) den frühesten und den spätesten Beginn sowie den Gesamtpuffer an.

**f)** Begründen Sie in zwei Sätzen, warum Vorgang 7 nicht auf dem kritischen Pfad liegt, obwohl er direkt vor dem kritischen Vorgang 8 steht.
