Aufgabe 5 – WLAN-Ausbau

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

Ausgangssituation: Die Verwaltung eines Berufsschulzentrums erhält ein neues WLAN. Die IT plant das Projekt mit den folgenden Vorgängen. Berechnen Sie den Netzplan.

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Bedarfsanalyse	2	–
B	Funkausleuchtung (Site Survey)	3	A
C	Access Points bestellen	5	B
D	Switch-Ports / PoE planen	2	B
E	WLAN-Controller einrichten	3	B
F	Access Points montieren	4	C
G	PoE-Switches konfigurieren	2	D
H	SSID- und Sicherheitskonzept	3	E
I	WLAN-Konfiguration ausrollen	2	F, G, H
J	Funktest / Messung	2	I
K	Nutzerinformation erstellen	3	H
L	Abnahme	1	J, K

Legende



Hinweis: Es gibt genau einen kritischen Pfad. Notieren Sie sich bei jedem Vorgang, wie Sie FAZ/SEZ ermittelt haben (MAX vorwärts, MIN rückwärts).

Aufgabe 5 – WLAN-Ausbau – Netzplan

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

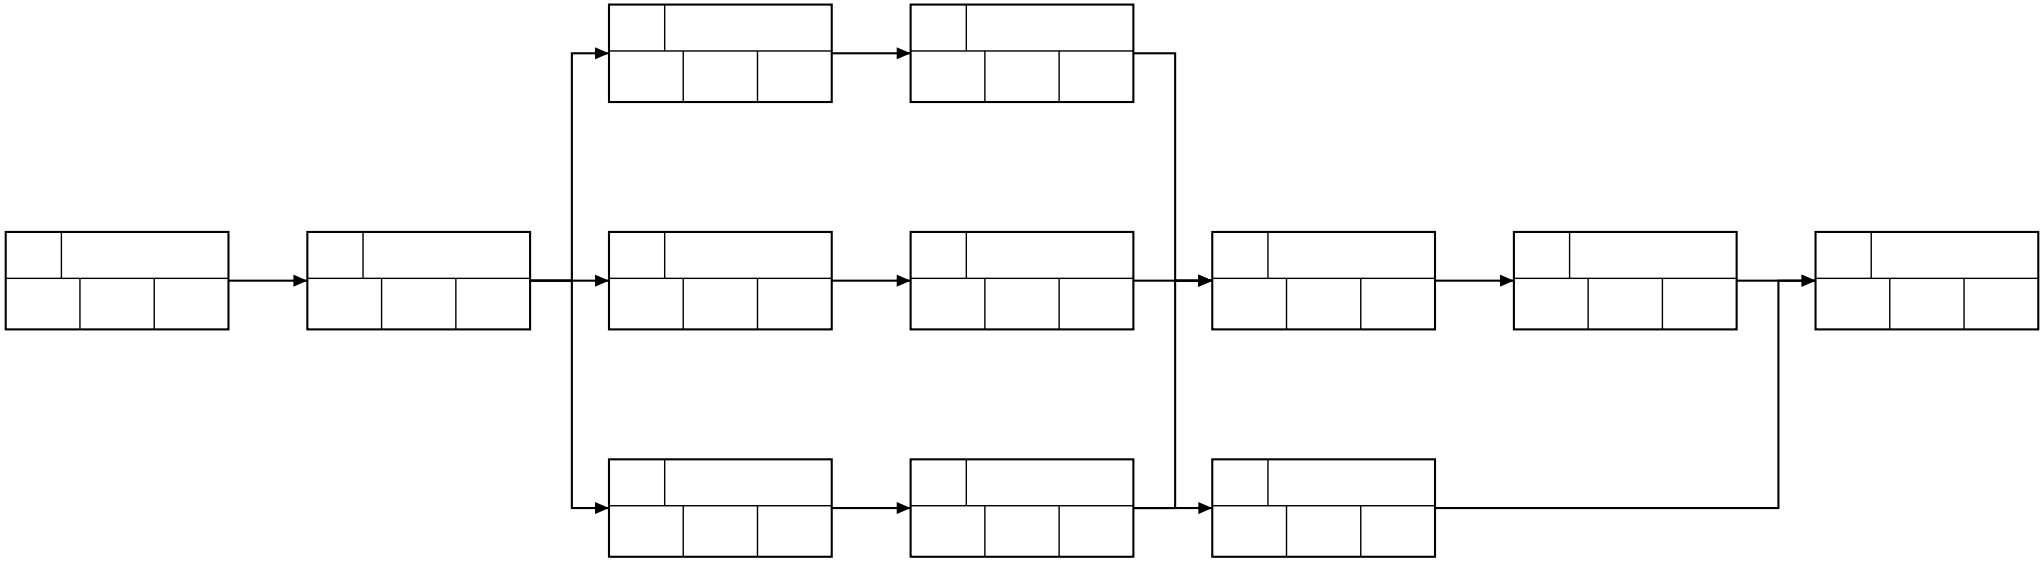

Projektdauer: _____ Tage

Kritische(r) Pfad(e): _____

Aufgabe 5 – WLAN-Ausbau – Fragen

Begründen Sie jede Antwort mit den Zeitwerten aus Ihrem Netzplan.

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

c) Das Sicherheitskonzept (H) dauert 2 Tage länger als geplant. Verzögert sich das Projekt? Begründen Sie mit dem Gesamtpuffer.

d) Die Montage der Access Points (F) verzögert sich wegen Lieferproblemen um 3 Tage. Um wie viele Tage verschiebt sich das Projektende?

e) Der Einkauf kann die Bestellung der Access Points (C) um 3 Tage beschleunigen (C dauert nur noch 2 Tage). Um wie viele Tage wird das Projekt kürzer? Erklären Sie das Ergebnis.

f) Bei Vorgang K sind Gesamtpuffer und freier Puffer gleich groß. Erklären Sie, woran das liegt.
