Aufgabe 6 – Datenbank-Migration – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

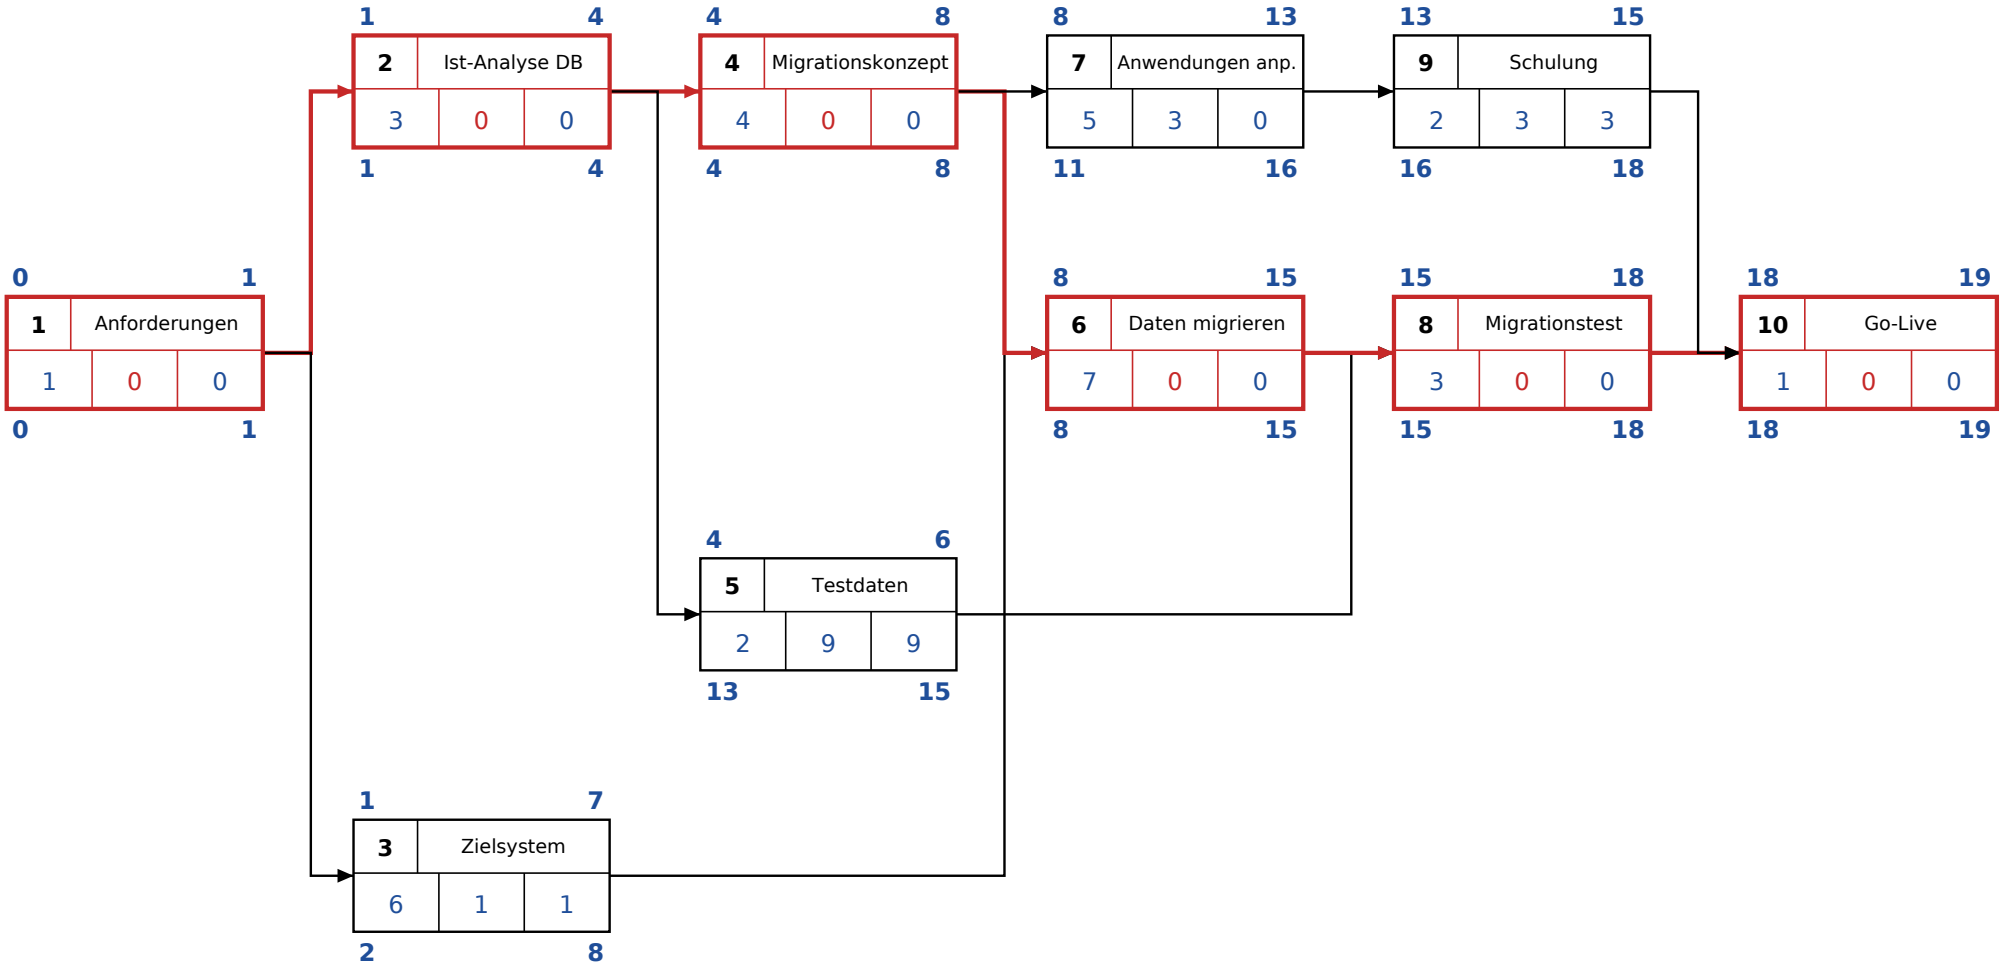

Legende



Projektdauer: **19 Tage**

Kritische(r) Pfad(e): **1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 10**

Aufgabe 6 – Datenbank-Migration – Lösungen zu den Fragen

b) Projektdauer und kritischer Pfad?

19 Tage. Kritischer Pfad: 1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 10. Alle Vorgänge dieser Kette haben GP = 0, kein anderer Weg ist gleich lang.

c) Die Bereitstellung des Zielsystems (3) dauert 2 Tage länger. Was passiert mit der Projektdauer?

Ja. Der Gesamtpuffer von 3 beträgt 1 Tage. Es bleiben 1 Tage Verzögerung, das Projektende verschiebt sich von 19 auf 20 Tage.

d) Die Datenmigration (6) kann durch zusätzliche Hardware um 2 Tage verkürzt werden. Um wie viele Tage endet das Projekt früher?

Das Projekt wird um 2 Tage kürzer (neue Dauer 17 Tage), weil 6 auf dem kritischen Pfad liegt.

e) Vorgang 7 hat einen GP von 3, aber nur einen FP von 0. Was bedeutet das für die Person, die die Anwendungen anpasst?

Vorgang 7 darf insgesamt 3 Tage später fertig werden, ohne dass Go-Live später liegt (GP). Wegen FP = 0 wird aber schon bei 1 Tag Verzögerung der früheste Start der Schulung (9) nach hinten geschoben; die Schulung rutscht dann in ihren eigenen Puffer.
