Aufgabe 6 – Datenbank-Migration

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

Ausgangssituation: Ein Unternehmen migriert seine Kundendatenbank auf ein neues System. Beachten Sie die Abhängigkeiten – der Migrationstest braucht Testdaten und die fertige Datenmigration.

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
1	Anforderungen aufnehmen	1	–
2	Ist-Analyse Datenbank	3	1
3	Zielsystem bereitstellen	6	1
4	Migrationskonzept erstellen	4	2
5	Testdaten bereitstellen	2	2
6	Daten migrieren	7	3, 4
7	Anwendungen anpassen	5	4
8	Migrationstest	3	5, 6
9	Anwenderschulung	2	7
10	Go-Live	1	8, 9

Legende



Hinweis: Es gibt genau einen kritischen Pfad. Notieren Sie sich bei jedem Vorgang, wie Sie FAZ/SEZ ermittelt haben (MAX vorwärts, MIN rückwärts).

Aufgabe 6 – Datenbank-Migration – Netzplan

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

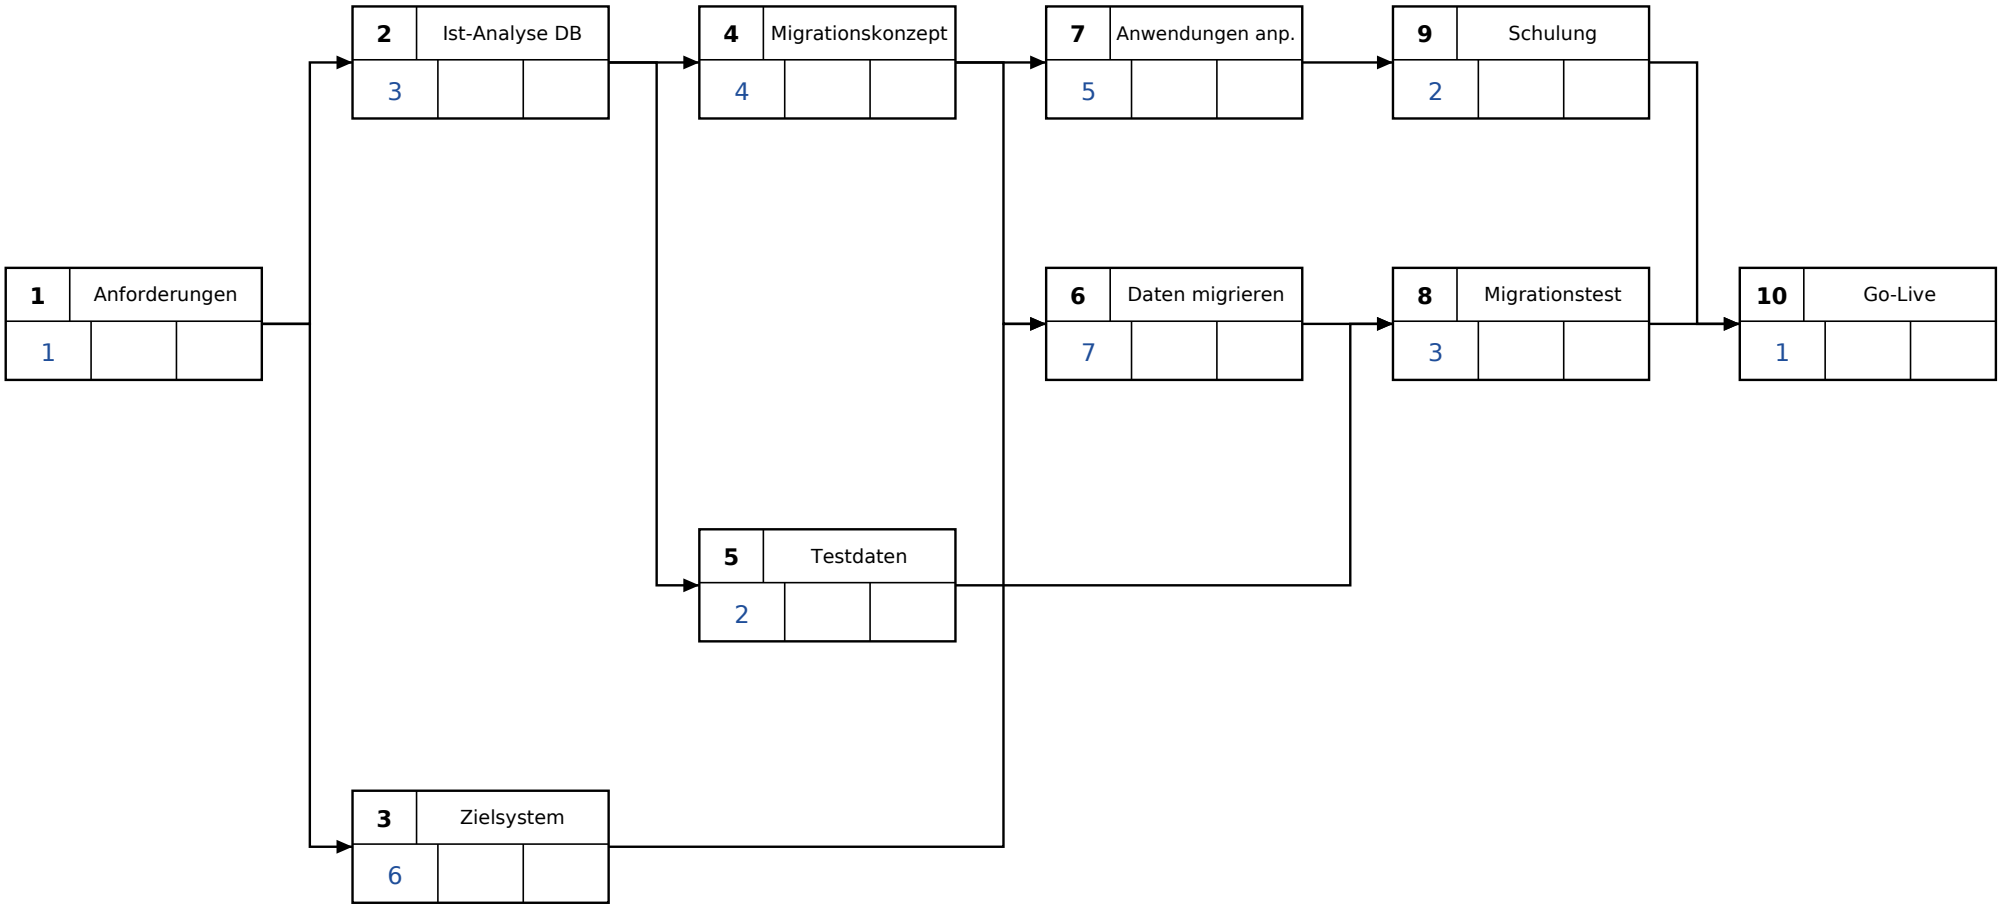

Projektdauer: _____ Tage

Kritische(r) Pfad(e): _____

Aufgabe 6 – Datenbank-Migration – Fragen

Begründen Sie jede Antwort mit den Zeitwerten aus Ihrem Netzplan.

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

c) Die Bereitstellung des Zielsystems (3) dauert 2 Tage länger. Was passiert mit der Projektdauer?

d) Die Datenmigration (6) kann durch zusätzliche Hardware um 2 Tage verkürzt werden. Um wie viele Tage endet das Projekt früher?

e) Vorgang 7 hat einen GP von 3, aber nur einen FP von 0. Was bedeutet das für die Person, die die Anwendungen anpasst?
