Aufgabe 7 – Homeoffice-Ausstattung

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

Ausgangssituation: Ein Unternehmen stattet 40 Mitarbeiter mit Homeoffice-Arbeitsplätzen aus (Notebook, Headset, VPN-Zugang). Nach der Budgetfreigabe laufen Beschaffung und VPN-Einrichtung parallel.

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Bedarfsabfrage Mitarbeiter	2	–
B	Budgetfreigabe	3	A
C	Notebooks bestellen und liefern	8	B
D	VPN-Konzept erstellen	4	A
E	VPN-Gateway einrichten	3	D
F	Headsets bestellen und liefern	5	B
G	Notebooks imagen	4	C
H	VPN-Zugänge anlegen	2	E
I	Schulungsunterlagen erstellen	3	D
J	Pakete verpacken und versenden	3	G, F
K	Online-Schulung durchführen	2	H, I
L	Projektabschluss	1	J, K

Legende



Hinweis: Es gibt genau einen kritischen Pfad. Notieren Sie sich bei jedem Vorgang, wie Sie FAZ/SEZ ermittelt haben (MAX vorwärts, MIN rückwärts).

Aufgabe 7 – Homeoffice-Ausstattung – Netzplan

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

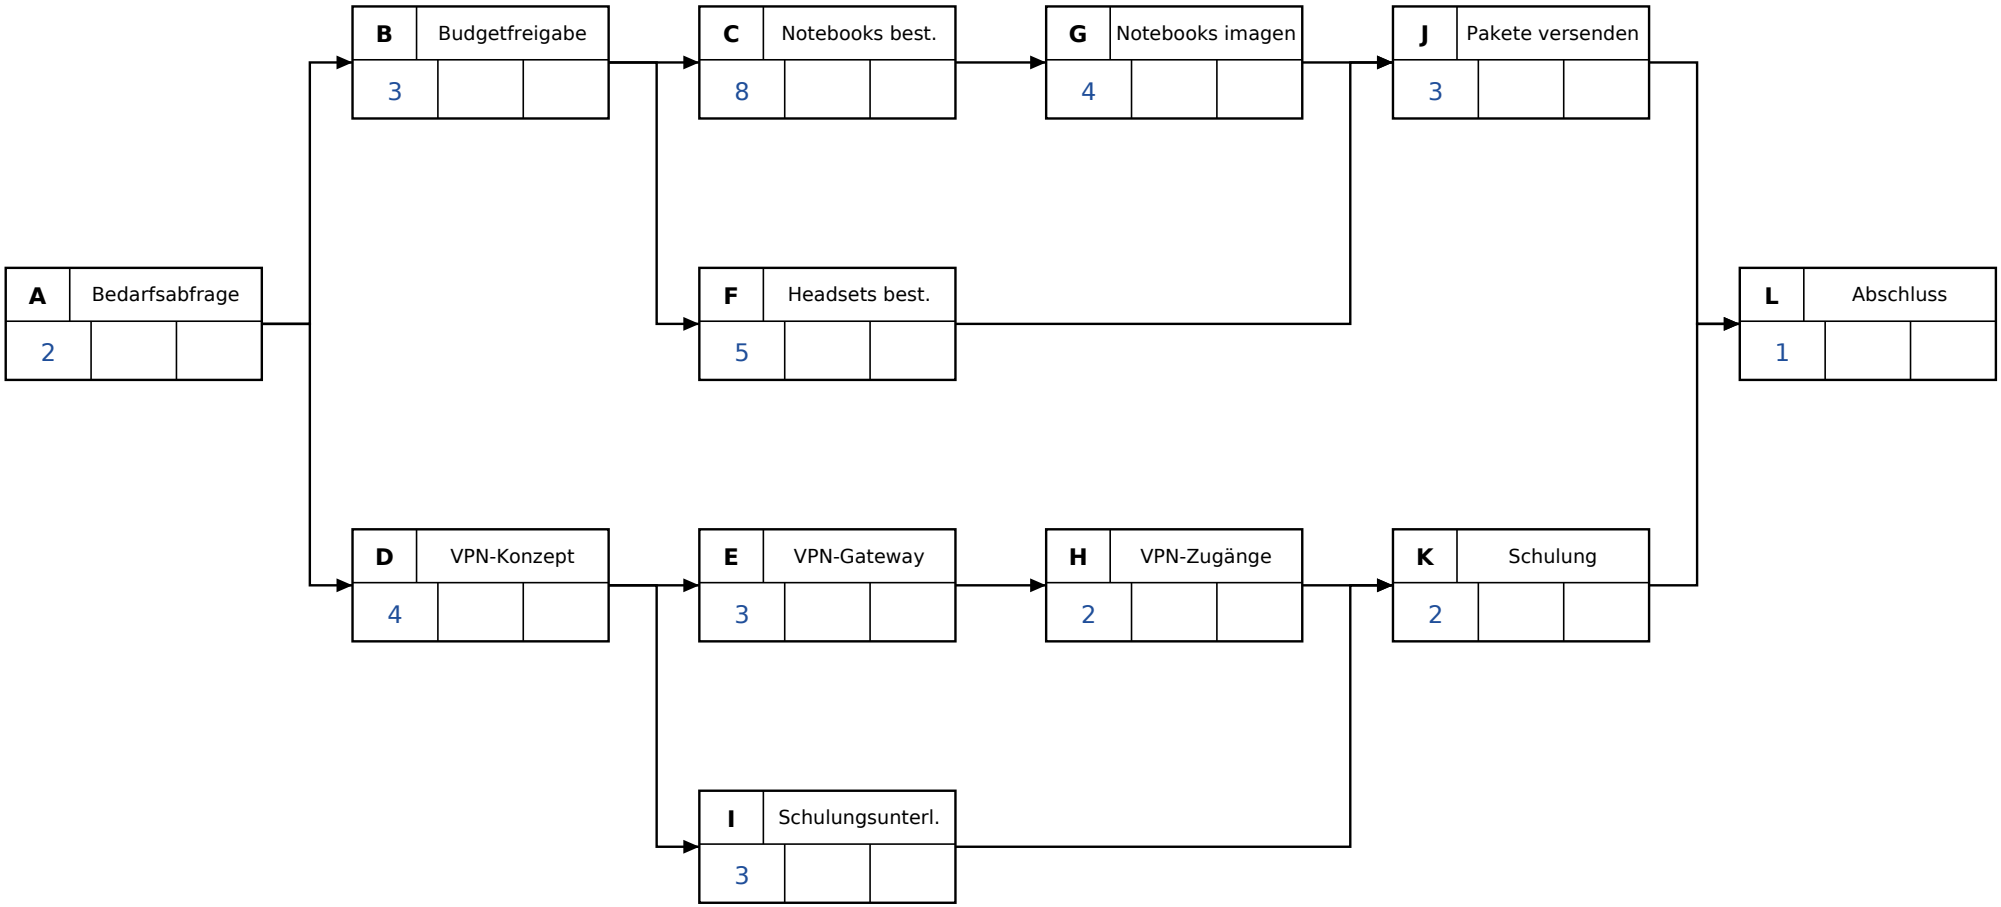

Projektdauer: _____ Tage

Kritische(r) Pfad(e): _____

Aufgabe 7 – Homeoffice-Ausstattung – Fragen

Begründen Sie jede Antwort mit den Zeitwerten aus Ihrem Netzplan.

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

c) Die Headsets (F) werden erst 6 Tage später geliefert. Gefährdet das den Projektabschluss?

d) Die Online-Schulung (K) muss wegen Krankheit um 5 Tage verschoben werden (K beginnt 5 Tage später). Wie wirkt sich das aus?

e) Die Geschäftsführung will 2 Tage sparen und fragt, ob man das VPN-Konzept (D) um 2 Tage kürzen soll. Lohnt sich das? Begründen Sie.

f) Berechnen Sie, um wie viele Tage sich das Projekt verkürzt, wenn Sie die Notebook-Lieferung (C) um 4 Tage beschleunigen können.
