Aufgabe 7 – Homeoffice-Ausstattung – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

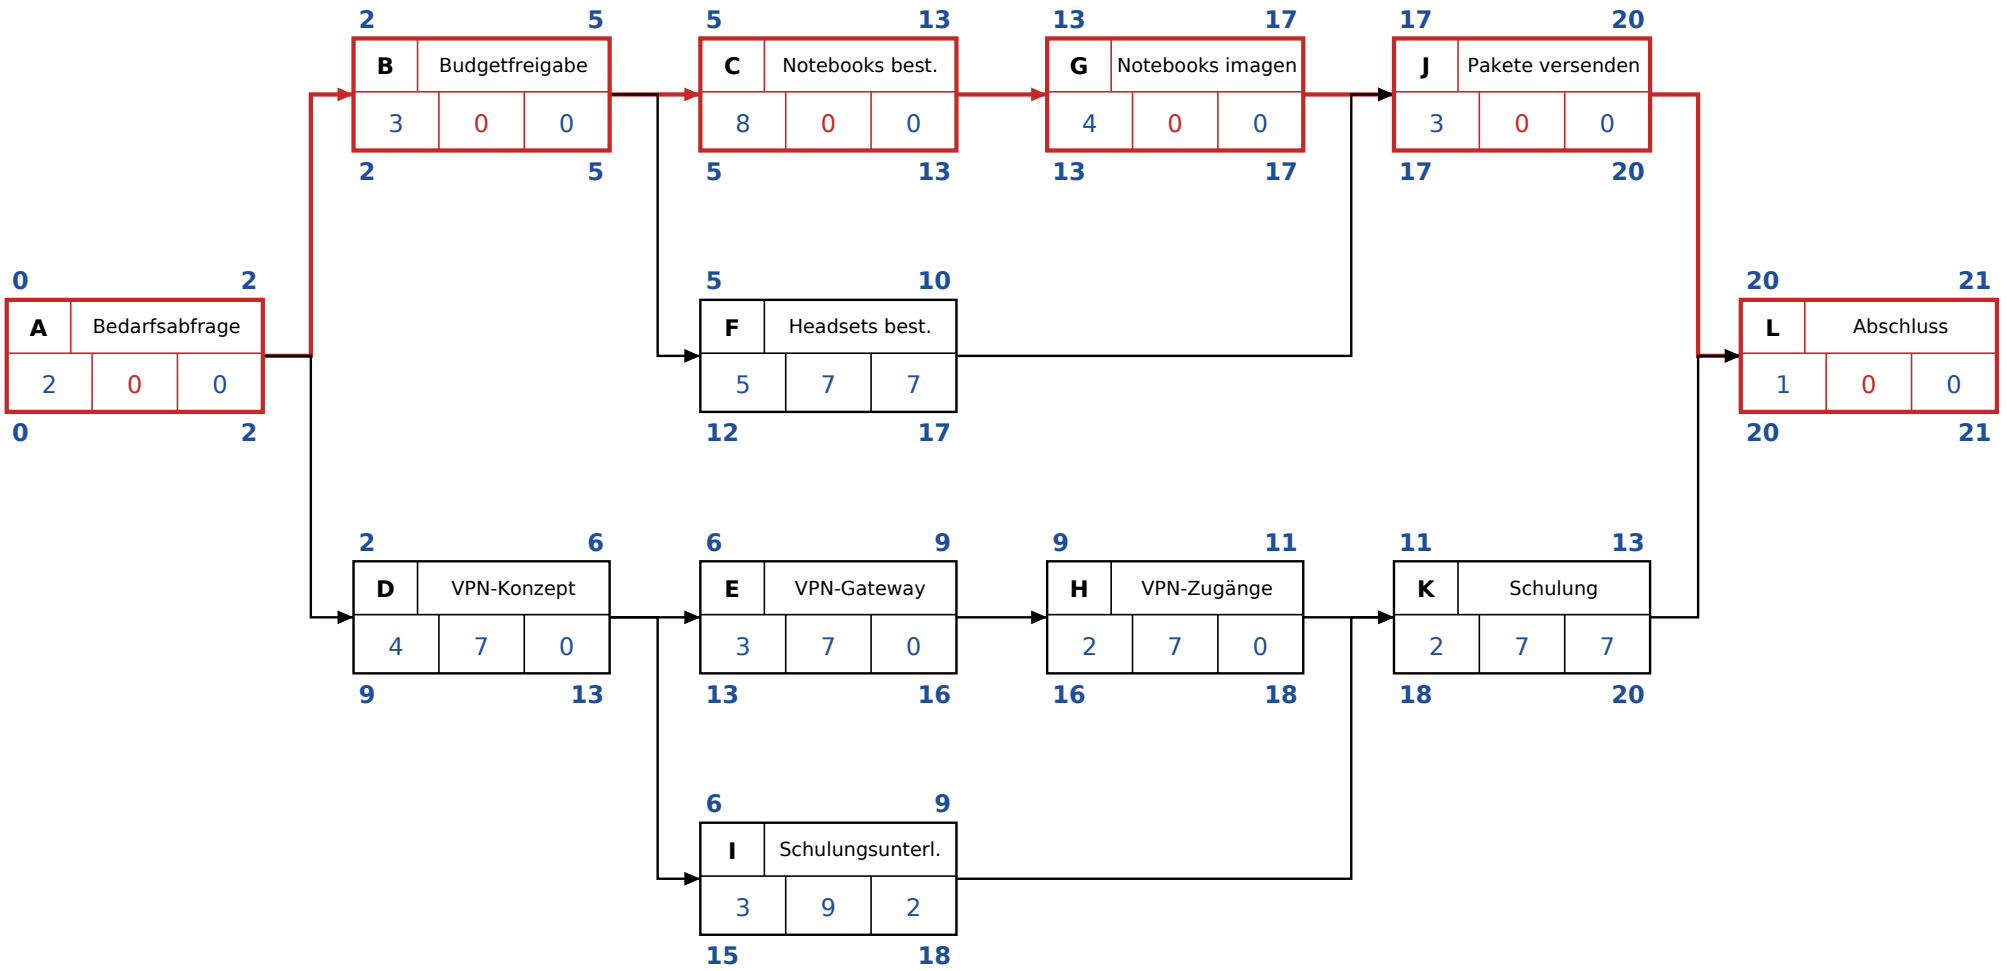

Legende



Projektdauer: **21 Tage**

Kritische(r) Pfad(e): **A → B → C → G → J → L**

Aufgabe 7 – Homeoffice-Ausstattung – Lösungen zu den Fragen

b) Projektdauer und kritischer Pfad?

21 Tage. Kritischer Pfad: A → B → C → G → J → L. Alle Vorgänge dieser Kette haben GP = 0, kein anderer Weg ist gleich lang.

c) Die Headsets (F) werden erst 6 Tage später geliefert. Gefährdet das den Projektabschluss?

Nein. Vorgang F hat 7 Tage Gesamtpuffer; die Verzögerung von 6 Tagen wird vollständig aufgefangen, das Projekt bleibt bei 21 Tagen.

d) Die Online-Schulung (K) muss wegen Krankheit um 5 Tage verschoben werden (K beginnt 5 Tage später). Wie wirkt sich das aus?

Nein. Vorgang K hat 7 Tage Gesamtpuffer; die Verzögerung von 5 Tagen wird vollständig aufgefangen, das Projekt bleibt bei 21 Tagen.

e) Die Geschäftsführung will 2 Tage sparen und fragt, ob man das VPN-Konzept (D) um 2 Tage kürzen soll. Lohnt sich das? Begründen Sie.

Nein. D hat GP = 7, liegt also nicht auf dem kritischen Pfad. Eine Kürzung von D ändert die Projektdauer von 21 Tagen nicht. Sinnvoll wäre nur die Kürzung eines Vorgangs auf dem kritischen Pfad (z. B. C).

f) Berechnen Sie, um wie viele Tage sich das Projekt verkürzt, wenn Sie die Notebook-Lieferung (C) um 4 Tage beschleunigen können.

Das Projekt wird um 4 Tage kürzer (neue Dauer 17 Tage), weil C auf dem kritischen Pfad liegt.
