Aufgabe 2 – Umzug in den neuen Serverraum – Lösung

Schwierigkeit: Mittel

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Umzug planen	2	–
2	Neue Racks bestellen	5	1
3	Backup aller Server	2	1
4	Racks montieren	2	2
5	Server umziehen	3	3, 4
6	Funktionstest	2	5
7	◆ Inbetriebnahme	0	6

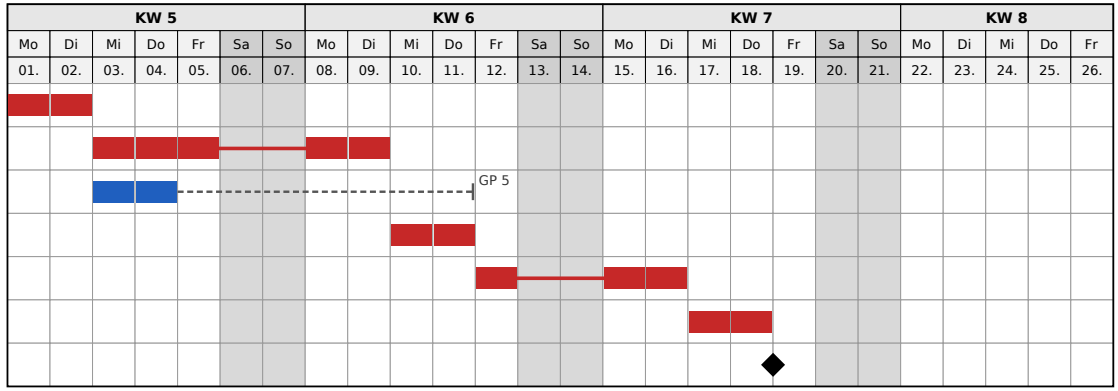

kritischer Vorgang (GP = 0) · nicht kritischer Vorgang · Gesamtpuffer · Meilenstein

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.

Inbetriebnahme: Do, 18.02.2027 · Kritischer Pfad: 1 → 2 → 4 → 5 → 6

Aufgabe 2 – Umzug in den neuen Serverraum – Antworten

a) Tragen Sie alle Vorgänge frühestmöglich in das Gantt-Diagramm ein.

Siehe Lösungsdiagramm.

b) An welchem Datum wird der Meilenstein „Inbetriebnahme“ erreicht?

Am Donnerstag, 18.02.2027 (nach 14 Arbeitstagen).

c) Nennen Sie den kritischen Pfad.

1 → 2 → 4 → 5 → 6 → Meilenstein 7

d) Wie viel Puffer hat „Backup aller Server“, und bis zu welchem Datum muss das Backup spätestens fertig sein?

5 Arbeitstage Puffer. Das Backup endet frühestens am Do, 04.02.2027. Spätestens fertig sein muss es am Do, 11.02.2027, weil „Server umziehen“ am Fr, 12.02.2027 beginnt.

e) Warum hat ein Meilenstein die Dauer 0?

Ein Meilenstein ist keine Tätigkeit, sondern ein Zeitpunkt, an dem ein wichtiges Ergebnis erreicht ist. Er hat deshalb keine Dauer und wird als Raute dargestellt.
