
Aufgabe 5 – Migration des E-Mail-Systems (Prüfungsniveau) – Lösung

Schwierigkeit: Prüfungsniveau

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Kick-off	1	–
2	Ist-Analyse	3	1
3	Server bereitstellen	4	2
4	Postfächer anlegen	2	3
5	Testmigration	3	3
M1	◆ Testmigration abgeschl.	0	5
6	Schulung Mitarbeiter	2	2
7	Migration durchführen	2	4, 5
8	Altsystem abschalten	1	7
M2	◆ Projektende	0	8

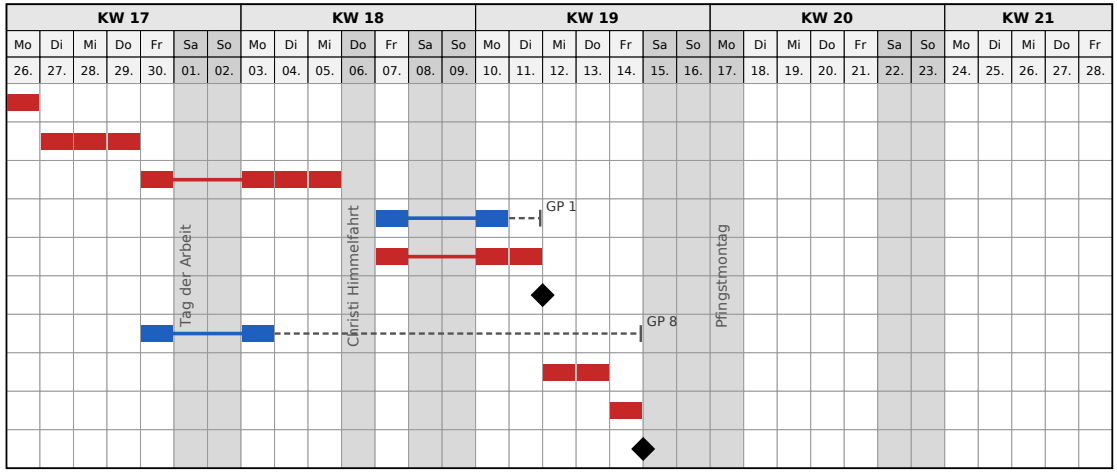

kritischer Vorgang (GP = 0) · nicht kritischer Vorgang · Gesamtpuffer · Meilenstein

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.

M1: Di, 11.05.2027 · M2 (Projektende): Fr, 14.05.2027 · Kritischer Pfad: 1 → 2 → 3 → 5 → 7 → 8

Aufgabe 5 – Migration des E-Mail-Systems (Prüfungsniveau) – Antworten

a) Vervollständigen Sie das Gantt-Diagramm.

Siehe Lösungsdiagramm.

b) An welchen Daten werden die Meilensteine M1 und M2 erreicht?

M1 (Testmigration abgeschlossen): Dienstag, 11.05.2027. M2 (Projektende): Freitag, 14.05.2027.

c) Warum hat der Feiertag am 01.05.2027 keinen Einfluss auf den Plan?

Der 1. Mai 2027 ist ein Samstag. Daran wird ohnehin nicht gearbeitet.

d) Die Testmigration dauert 3 Tage länger als geplant. Wann ist das neue Projektende?

Testmigration endet am Fr, 14.05. Migration durchführen am Di 18.05. und Mi 19.05. (Pfingstmontag 17.05. entfällt), Altsystem abschalten am Do 20.05. Neues Projektende: Donnerstag, 20.05.2027.

e) Die Geschäftsführung besteht trotzdem auf dem 14.05.2027. Nennen Sie drei Maßnahmen.

Zum Beispiel: zusätzliches Personal für die Testmigration · Überstunden oder Samstagsarbeit · „Altsystem abschalten“ nach dem Stichtag erledigen (Umfang reduzieren) · Migration teilweise parallel zur Testmigration starten (Risiko!). Wichtig: Nur Maßnahmen auf dem kritischen Pfad verkürzen das Projekt. Die Schulung (Vorgang 6) zu verschieben bringt nichts.
