Aufgabe 1 – Schulungsraum einrichten – Lösung

Schwierigkeit: Einstieg

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
A	Bedarfsanalyse	2	–
B	Hardware bestellen	5	A
C	Netzwerkdosen installieren	3	A
D	Möbel aufstellen	2	A
E	Rechner aufbauen	3	B, D
F	Netzwerk testen	1	C, E
G	Abnahme	1	F

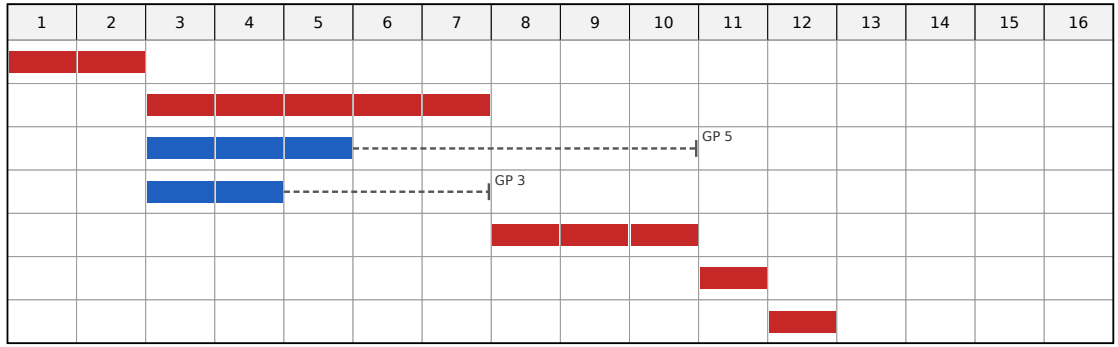

kritischer Vorgang (GP = 0) · nicht kritischer Vorgang · Gesamtpuffer · Meilenstein

Projektdauer: 12 Arbeitstage · Kritischer Pfad: A → B → E → F → G

Aufgabe 1 – Schulungsraum einrichten – Antworten

a) Zeichnen Sie für alle Vorgänge die Balken in das Gantt-Diagramm ein.

Siehe Lösungsdiagramm.

b) Kennzeichnen Sie den kritischen Pfad und geben Sie die Projektdauer an.

Kritischer Pfad: A → B → E → F → G. Projektdauer: 12 Arbeitstage.

c) Bestimmen Sie den Gesamtpuffer der Vorgänge C und D.

C: 5 Tage. C ist am Ende von Tag 5 fertig, F beginnt aber erst an Tag 11, also darf C spätestens am Ende von Tag 10 fertig sein.
D: 3 Tage. D ist am Ende von Tag 4 fertig, E beginnt erst an Tag 8, weil E auch auf B warten muss.

d) Vorgang D verzögert sich um 2 Tage. Hat das Auswirkungen auf das Projektende?

Nein. D hat 3 Tage Puffer. D endet dann an Tag 6 statt an Tag 4. E kann trotzdem erst an Tag 8 beginnen, weil E auf B wartet.
