Aufgabe 3 – Druckerrollout über Ostern – Lösung

Schwierigkeit: Mittel

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Bestandsaufnahme	2	–
2	Drucker bestellen	4	1
3	Treiberpaket erstellen	3	1
4	Testinstallation	1	2, 3
5	Rollout Etage 1	2	4
6	Rollout Etage 2	3	4
7	Altgeräte abbauen	1	5, 6
8	◆ Rollout abgeschlossen	0	7

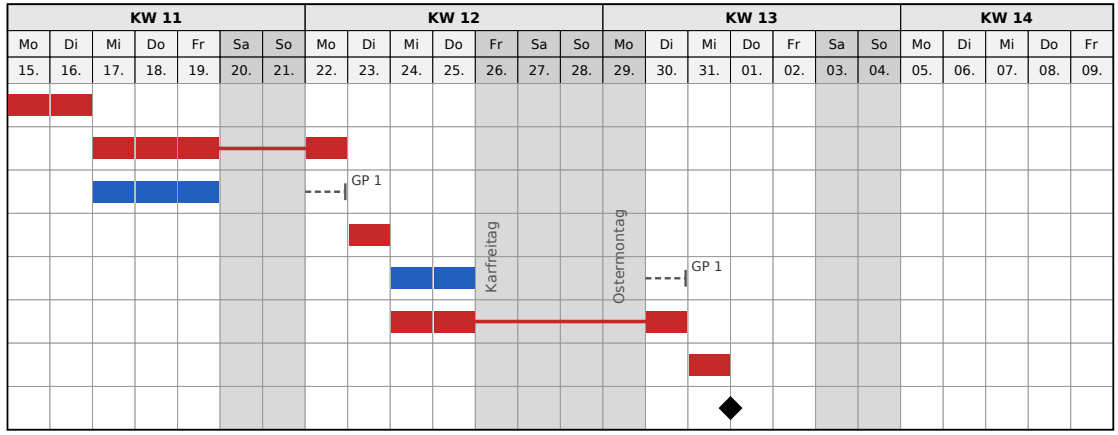

kritischer Vorgang (GP = 0) · nicht kritischer Vorgang · Gesamtpuffer · Meilenstein

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.

Rollout abgeschlossen: Mi, 31.03.2027 · Kritischer Pfad: 1 → 2 → 4 → 6 → 7

Aufgabe 3 – Druckerrollout über Ostern – Antworten

a) Tragen Sie alle Vorgänge frühestmöglich in das Gantt-Diagramm ein.

Siehe Lösungsdiagramm. „Rollout Etage 2“ wird durch Ostern unterbrochen: Mi 24.03., Do 25.03., Di 30.03.

b) An welchem Datum ist der Rollout abgeschlossen?

Am Mittwoch, 31.03.2027 (nach 11 Arbeitstagen).

c) An welchem Datum wäre das Projekt ohne die Feiertage fertig? Um wie viele Tage verschiebt es sich?

Ohne Feiertage wäre der 11. Arbeitstag Montag, 29.03.2027. Durch die zwei Feiertage verschiebt sich das Ende um 2 Arbeitstage auf den 31.03.2027.

d) Nennen Sie den kritischen Pfad und den Puffer der Vorgänge 3 und 5.

Kritischer Pfad: 1 → 2 → 4 → 6 → 7. Vorgang 3 hat 1 Tag Puffer (spätestens fertig am Mo, 22.03.). Vorgang 5 hat 1 Tag Puffer (spätestens fertig am Di, 30.03., weil die Feiertage dazwischen liegen).
