
Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt – Lösung a/b)

Schwierigkeit: Mittel bis schwer

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.	Bearb.
A	Anforderungen klären	2	–	Fr. Klein
B	Hardware vorbereiten	4	A	Hr. Yilmaz
C	Software-Images erstellen	3	A	Hr. Yilmaz
D	Netzwerkanschlüsse prüfen	2	A	Fr. Klein
E	Arbeitsplätze aufbauen	3	B, C	Hr. Yilmaz
F	Benutzer einweisen	2	D, E	Fr. Klein

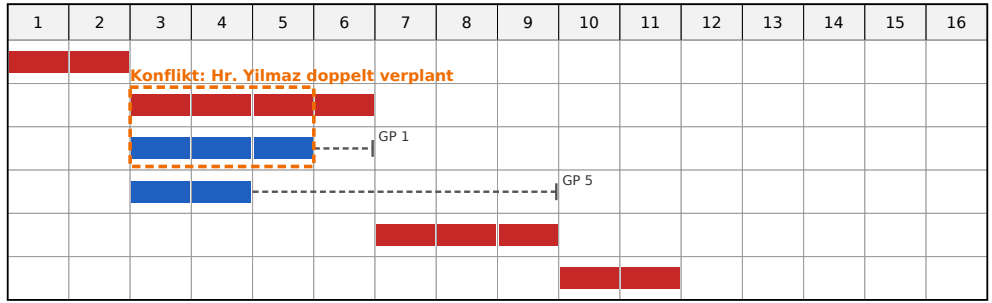


kritischer Vorgang (GP = 0) nicht kritischer Vorgang Gesamtpuffer Meilenstein

Projektdauer ohne Ressourcenplanung: 11 Tage – aber Herr Yilmaz ist an Tag 3–5 doppelt verplant!

Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt – Lösung c)

Schwierigkeit: Mittel bis schwer

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.	Bearb.
A	Anforderungen klären	2	–	Fr. Klein
B	Hardware vorbereiten	4	A	Hr. Yilmaz
C	Software-Images erstellen	3	A, B	Hr. Yilmaz
D	Netzwerkanschlüsse prüfen	2	A	Fr. Klein
E	Arbeitsplätze aufbauen	3	B, C	Hr. Yilmaz
F	Benutzer einweisen	2	D, E	Fr. Klein

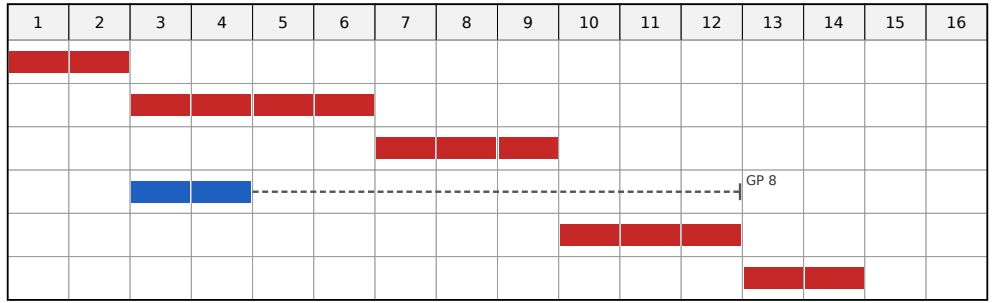

kritischer Vorgang (GP = 0) nicht kritischer Vorgang Gesamtpuffer Meilenstein

C wird hinter B gelegt (neuer Vorgänger B) → Projektdauer 14 Tage (+3 Tage)
Jetzt ist auch C kritisch, D hat 8 Tage Puffer.

Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt – Antworten

a) Erstellen Sie das Gantt-Diagramm zunächst ohne Rücksicht auf die Bearbeiter. Wie lange dauert das Projekt?

11 Arbeitstage. Kritischer Pfad: A → B → E → F.

b) Prüfen Sie den Plan auf Ressourcenkonflikte. Wo tritt ein Konflikt auf?

Herr Yilmaz müsste an Tag 3 bis 5 gleichzeitig „Hardware vorbereiten“ (B) und „Software-Images erstellen“ (C) bearbeiten. Frau Klein hat keinen Konflikt (A, D und F überschneiden sich nicht).

c) Lösen Sie den Konflikt durch Verschieben eines Vorgangs auf und zeichnen Sie das Diagramm neu. Wie lange dauert das Projekt jetzt?

C wird hinter B gelegt: C an Tag 7–9, E an Tag 10–12, F an Tag 13–14. Das Projekt dauert 14 Tage, also 3 Tage länger. B hinter C zu legen ergibt ebenfalls 14 Tage.

d) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, den Konflikt zu lösen, ohne dass sich das Projekt verlängert.

Zum Beispiel: eine weitere Person übernimmt C (etwa ein Kollege oder ein externer Dienstleister) · Herr Yilmaz arbeitet an diesen Tagen mit Überstunden · Images automatisiert erstellen oder ein vorhandenes Image wiederverwenden.
