Aufgabe 5 – Migration des E-Mail-Systems (Prüfungsniveau)

Ausgangssituation

Im Krankenhaus wird das E-Mail-System migriert. Das Projekt beginnt am Montag, 26.04.2027. Es gelten die Feiertage in Niedersachsen. Gearbeitet wird Montag bis Freitag. Wochenenden und Feiertage sind grau hinterlegt. Die Vorgänge 1 bis 3 sind bereits eingetragen.

Aufgaben

a) Vervollständigen Sie das Gantt-Diagramm.

b) An welchen Daten werden die Meilensteine M1 und M2 erreicht?

c) Warum hat der Feiertag am 01.05.2027 keinen Einfluss auf den Plan?

d) Die Testmigration dauert 3 Tage länger als geplant. Wann ist das neue Projektende?

e) Die Geschäftsführung besteht trotzdem auf dem 14.05.2027. Nennen Sie drei Maßnahmen.

Aufgabe 5 – Migration des E-Mail-Systems (Prüfungsniveau)

Schwierigkeit: Prüfungsniveau

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Kick-off	1	–
2	Ist-Analyse	3	1
3	Server bereitstellen	4	2
4	Postfächer anlegen	2	3
5	Testmigration	3	3
M1	◆ Testmigration abgeschl.	0	5
6	Schulung Mitarbeiter	2	2
7	Migration durchführen	2	4, 5
8	Altsystem abschalten	1	7
M2	◆ Projektende	0	8

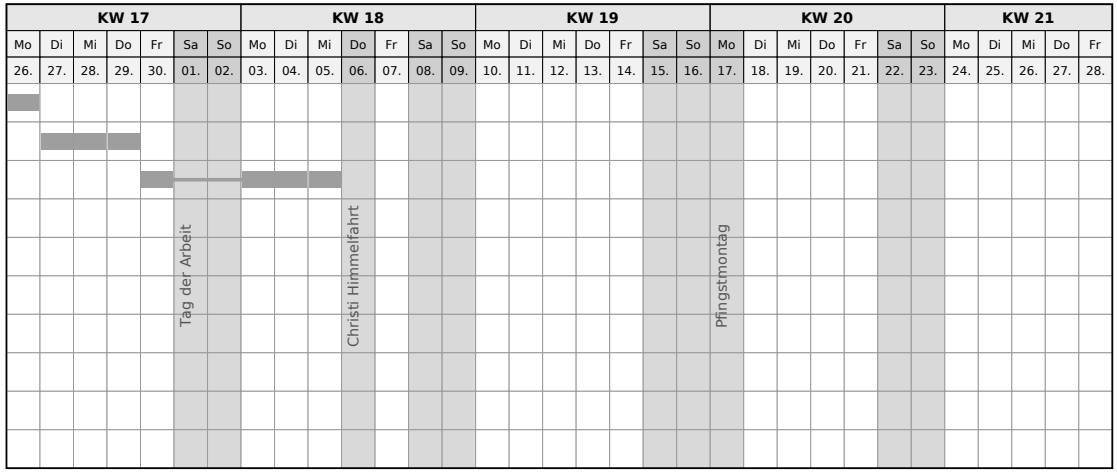

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.
