Aufgabe 1 – Arbeitsplatz einrichten

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

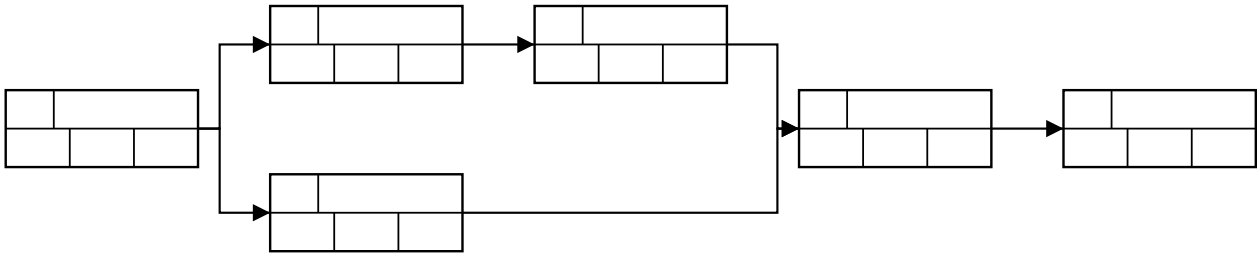

Legende



Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Anforderungen aufnehmen	2	–
B	Hardware bestellen	4	A
C	Software-Lizenzen beschaffen	2	A
D	Rechner aufbauen	3	B
E	Software installieren	2	C, D
F	Übergabe	1	E

Projektdauer: _____

Kritische(r) Pfad(e): _____

_____

Aufgabe 1 – Arbeitsplatz einrichten – Fragen

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

c) Die Lizenzen (C) kommen 4 Tage später als geplant. Verzögert sich das Projekt?
