Aufgabe 3 – Server- und Storage-Erneuerung

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

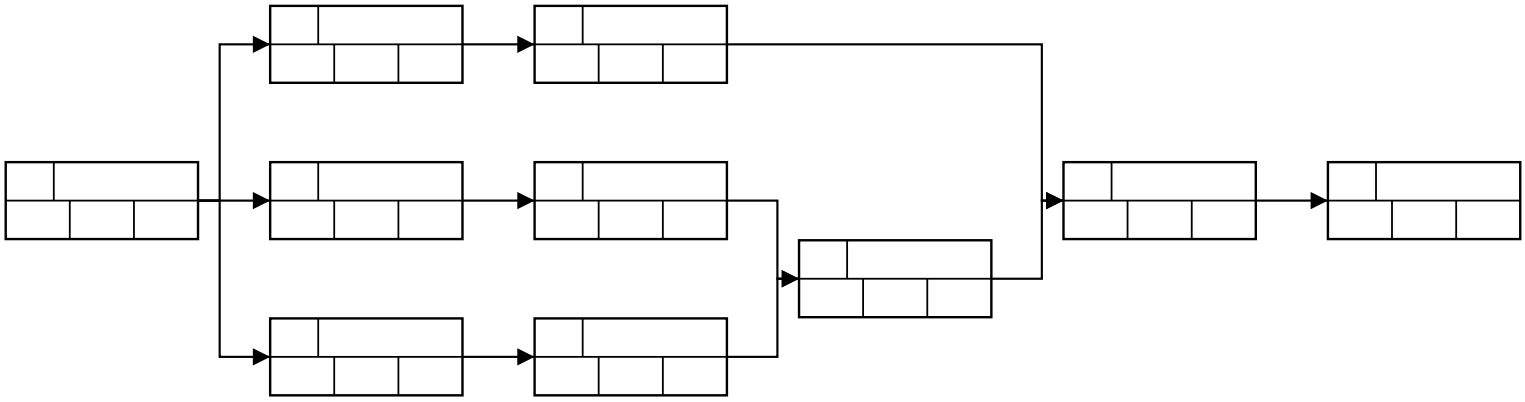

Legende



Projektdauer: _____

Kritische(r) Pfad(e): _____

_____

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Kick-off	1	–
B	Server bestellen	6	A
C	Storage bestellen	4	A
D	Backup-Konzept	3	A
E	Server einrichten	3	B
F	Storage einrichten	3	C
G	Backup-Software testen	2	D
H	Storage anbinden	2	F, G
I	Integrationstest	2	E, H
J	Abnahme	1	I

Aufgabe 3 – Server- und Storage-Erneuerung – Fragen

b) Nennen Sie Projektdauer und alle kritischen Pfade.

c) Der Server wird schneller bestellt (B = 5 statt 6). Verkürzt sich das Projekt um 1 Tag? Begründen Sie.
