Aufgabe 3 – Server- und Storage-Erneuerung – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

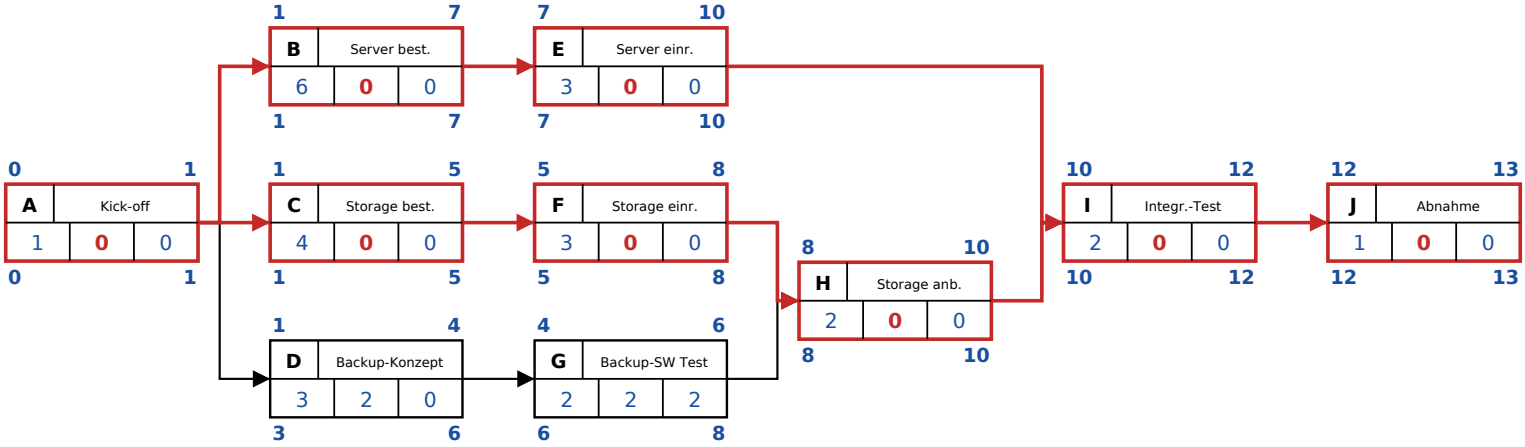

Legende



Projektdauer: **13 Tage**

Kritische(r) Pfad(e):
A → B → E → I → J
A → C → F → H → I → J

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Kick-off	1	–
B	Server bestellen	6	A
C	Storage bestellen	4	A
D	Backup-Konzept	3	A
E	Server einrichten	3	B
F	Storage einrichten	3	C
G	Backup-Software testen	2	D
H	Storage anbinden	2	F, G
I	Integrationstest	2	E, H
J	Abnahme	1	I

Aufgabe 3 – Server- und Storage-Erneuerung – Lösungen zu den Fragen

b) Nennen Sie Projektdauer und alle kritischen Pfade.

13 Tage. Zwei kritische Pfade: A → B → E → I → J und A → C → F → H → I → J. Beide Stränge sind genau 9 Tage lang und kommen gleichzeitig bei I an.

c) Der Server wird schneller bestellt (B = 5 statt 6). Verkürzt sich das Projekt um 1 Tag? Begründen Sie.

Nein. Der zweite kritische Pfad über C, F, H bleibt unverändert und bestimmt weiterhin das Ende bei 13 Tagen. Um zu verkürzen, müssen beide Pfade verkürzt werden.
