Aufgabe 1 – Arbeitsplatz einrichten – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

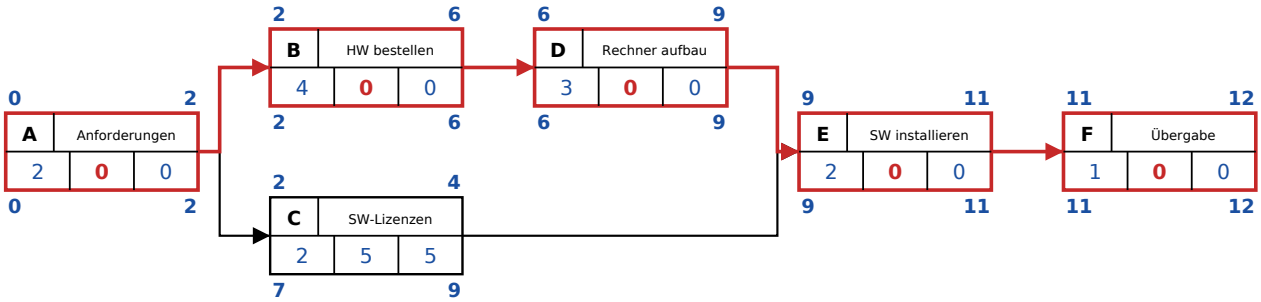

Legende



Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Anforderungen aufnehmen	2	–
B	Hardware bestellen	4	A
C	Software-Lizenzen beschaffen	2	A
D	Rechner aufbauen	3	B
E	Software installieren	2	C, D
F	Übergabe	1	E

Projektdauer: **12 Tage**

Kritische(r) Pfad(e):

A → B → D → E → F

Aufgabe 1 – Arbeitsplatz einrichten – Lösungen zu den Fragen

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

12 Tage. Kritischer Pfad: A → B → D → E → F.

c) Die Lizenzen (C) kommen 4 Tage später als geplant. Verzögert sich das Projekt?

Nein. C hat einen Gesamtpuffer von 5 Tagen, eine Verzögerung um 4 Tage wird vollständig aufgefangen.
