Aufgabe 2 – Netzwerkumbau

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

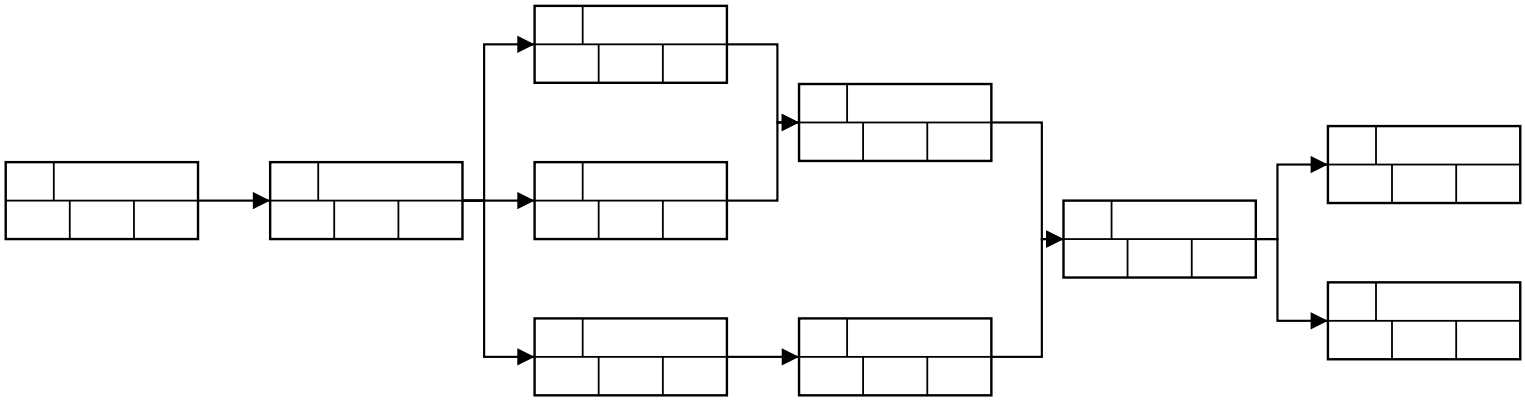

Legende



Projektdauer: _____

Kritische(r) Pfad(e): _____

_____

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
1	Ist-Analyse Netzwerk	2	–
2	Soll-Konzept erstellen	3	1
3	Switches bestellen	5	2
4	Kabel bestellen	2	2
5	IP-Adressplan erstellen	2	2
6	Verkabelung erneuern	4	4
7	Switches konfigurieren	2	3, 5
8	Switches einbauen	1	6, 7
9	Funktionstest	1	8
10	Dokumentation	2	8

Aufgabe 2 – Netzwerkumbau – Fragen

b) Nennen Sie Projektdauer und kritischen Pfad.

c) Vorgang 6 dauert 2 Tage länger. Um wie viele Tage verschiebt sich das Projektende?

d) Bei Vorgang 4 sind GP und FP unterschiedlich. Erklären Sie, woran das liegt.
