# Aufgabe 2 – Netzwerkumbau – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

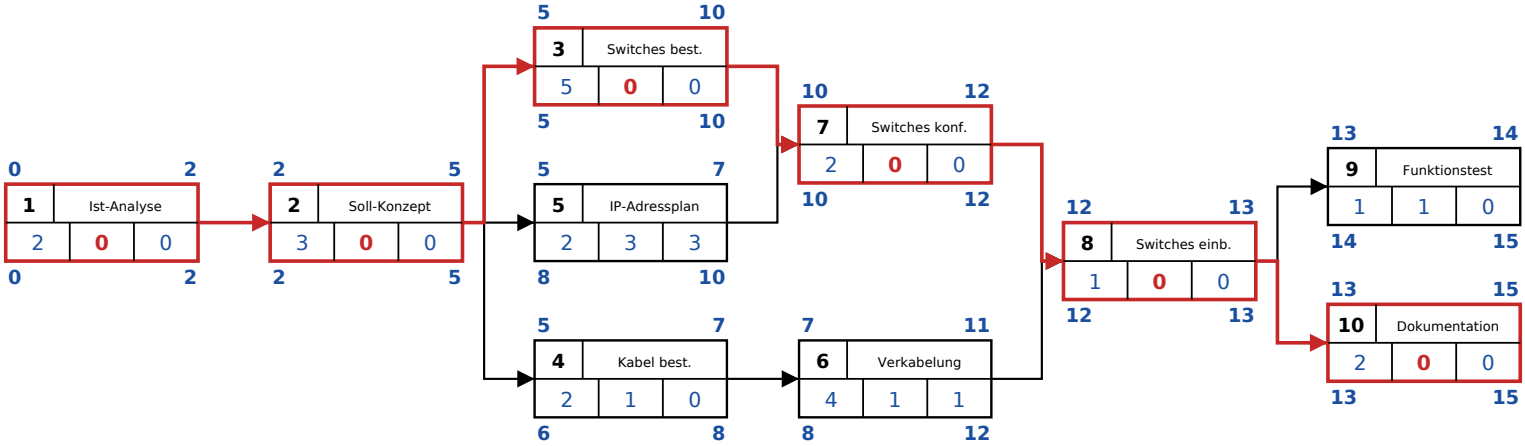


**Legende**




Projektdauer: **15 Tage**

Kritische(r) Pfad(e):
**1 → 2 → 3 → 7 → 8 → 10**

| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
|---|---|---|---|
| 1 | Ist-Analyse Netzwerk | 2 | – |
| 2 | Soll-Konzept erstellen | 3 | 1 |
| 3 | Switches bestellen | 5 | 2 |
| 4 | Kabel bestellen | 2 | 2 |
| 5 | IP-Adressplan erstellen | 2 | 2 |
| 6 | Verkabelung erneuern | 4 | 4 |
| 7 | Switches konfigurieren | 2 | 3, 5 |
| 8 | Switches einbauen | 1 | 6, 7 |
| 9 | Funktionstest | 1 | 8 |
| 10 | Dokumentation | 2 | 8 |

# Aufgabe 2 – Netzwerkumbau – Lösungen zu den Fragen

**b) Nennen Sie Projektdauer und kritischen Pfad.**

15 Tage. Kritischer Pfad: 1 → 2 → 3 → 7 → 8 → 10.

**c) Vorgang 6 dauert 2 Tage länger. Um wie viele Tage verschiebt sich das Projektende?**

Um 1 Tag (neue Dauer 16 Tage). Vorgang 6 hat GP = 1, also fängt der Puffer nur 1 der 2 Tage auf.

**d) Bei Vorgang 4 sind GP und FP unterschiedlich. Erklären Sie, woran das liegt.**

Der GP von 1 Tag gehört der ganzen Kette 4 → 6. FP = 0, weil Vorgang 6 direkt nach 4 frühestmöglich starten soll. Verbraucht 4 den Puffer, fehlt er Vorgang 6.
