Aufgabe 4 – Windows-Rollout

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

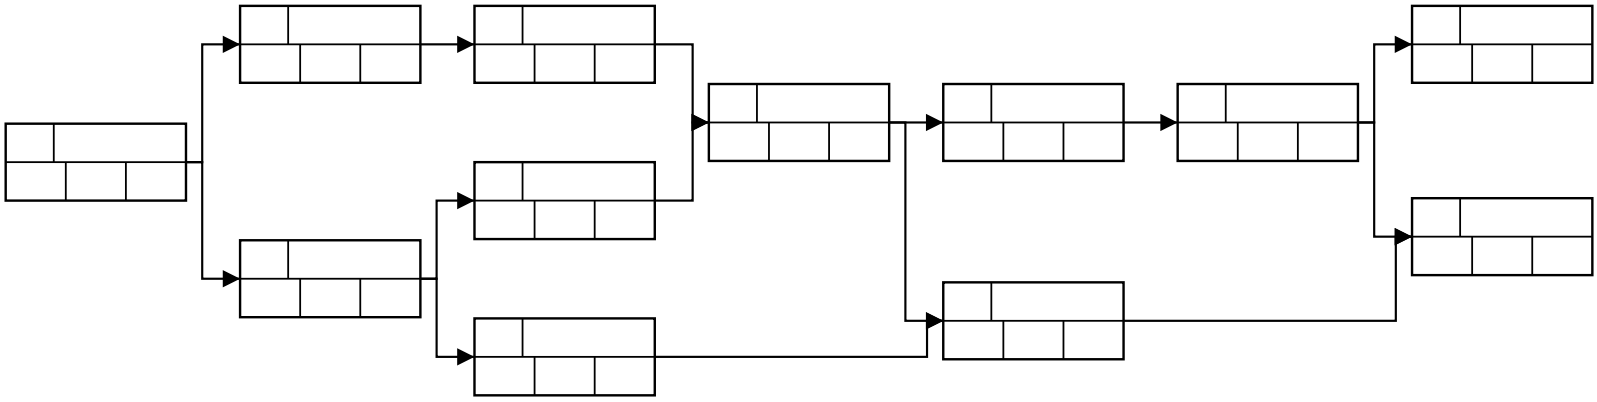

Legende



Projektdauer: _____

Kritische(r) Pfad(e): _____

_____

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
1	Projektauftrag	1	–
2	Bestandsaufnahme Clients	3	1
3	Image erstellen	5	1
4	Benutzerdaten sichern	4	2
5	Testinstallation	2	3
6	Schulungsunterlagen erstellen	3	3
7	Pilotgruppe ausrollen	2	4, 5
8	Feedback einarbeiten	2	7
9	Rollout restliche Clients	5	8
10	Mitarbeiterschulung	2	6, 7
11	Altgeräte entsorgen	1	9
12	Abschlussbericht	2	9, 10

Aufgabe 4 – Windows-Rollout – Fragen

b) Nennen Sie Projektdauer und kritischen Pfad.

c) Vorgang 6 hat einen GP von 6, aber nur einen FP von 1. Was bedeutet das praktisch für die Person, die die Schulungsunterlagen erstellt?

d) Erklären Sie in zwei Sätzen den Unterschied zwischen Gesamtpuffer und freiem Puffer.
