Aufgabe 4 – Windows-Rollout – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

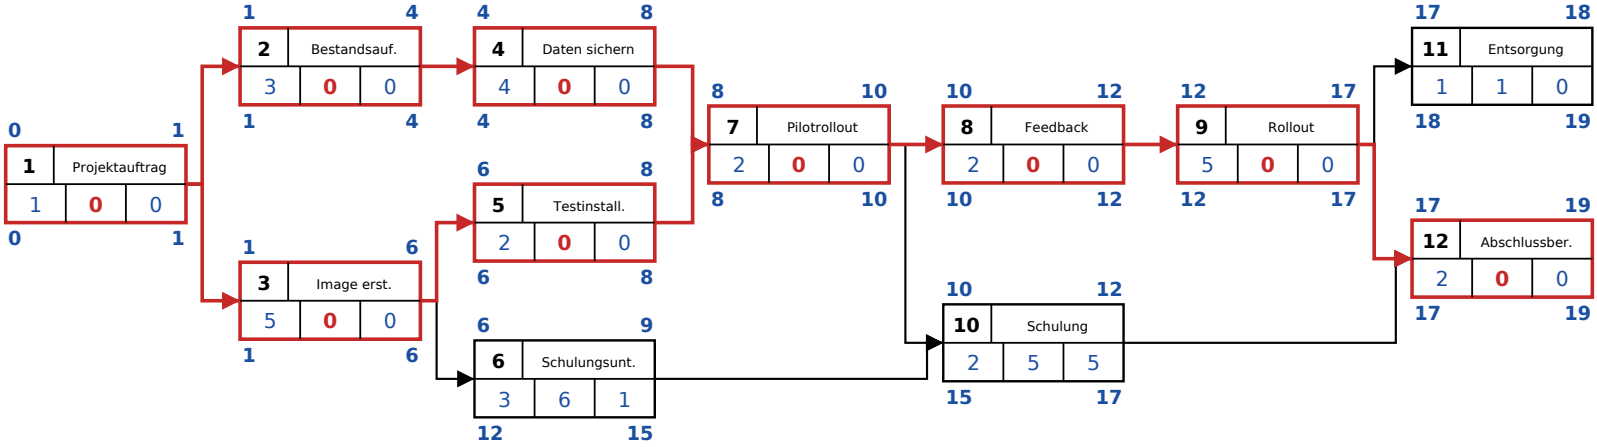

Legende

Projektdauer: **19 Tage**

Kritische(r) Pfad(e):

1 → 2 → 4 → 7 → 8 → 9 → 12

1 → 3 → 5 → 7 → 8 → 9 → 12

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
1	Projektauftrag	1	–
2	Bestandsaufnahme Clients	3	1
3	Image erstellen	5	1
4	Benutzerdaten sichern	4	2
5	Testinstallation	2	3
6	Schulungsunterlagen erstellen	3	3
7	Pilotgruppe ausrollen	2	4, 5
8	Feedback einarbeiten	2	7
9	Rollout restliche Clients	5	8
10	Mitarbeiterschulung	2	6, 7
11	Altgeräte entsorgen	1	9
12	Abschlussbericht	2	9, 10

Aufgabe 4 – Windows-Rollout – Lösungen zu den Fragen

b) Nennen Sie Projektdauer und kritischen Pfad.

19 Tage. Zwei kritische Pfade, weil 2 → 4 und 3 → 5 beide genau an Tag 8 enden: 1 → 2 → 4 → 7 → 8 → 9 → 12 und 1 → 3 → 5 → 7 → 8 → 9 → 12.

c) Vorgang 6 hat einen GP von 6, aber nur einen FP von 1. Was bedeutet das praktisch für die Person, die die Schulungsunterlagen erstellt?

Sie darf 1 Tag später fertig werden, ohne dass die Mitarbeiterschulung (10) später beginnen muss. Bis zu 6 Tage Verzögerung gefährden das Projektende nicht, die Schulung rutscht dann aber nach hinten und verliert ihren eigenen Puffer.

d) Erklären Sie in zwei Sätzen den Unterschied zwischen Gesamtpuffer und freiem Puffer.

Der Gesamtpuffer gibt an, wie weit sich ein Vorgang verschieben darf, ohne das Projektende zu gefährden. Der freie Puffer gibt an, wie weit er sich verschieben darf, ohne dass ein Nachfolger später anfangen muss.
